

— 민선9기, 시민주권시대 조기안착을 위한 —
중점 추진사업 점검 보고회

2026. 8. 3.(월) 여유당 16:00

<교통국>

1 「교통국」 중점 추진사업 총괄보고

■ 추진 현황

구 분	총계	점검사업			2회 추경사업
		소계	지속추진	재정비	
건 수	13	7	7	—	6

■ 중점사업 총괄현황

사업유형	주요내용	참고사진
☒ 지속추진 ☐ 재정비 ☐ 2회 추경	○ 사업명 : 별내선(8호선) 연장(별내~별내별가람) ○ 총사업비 : 4,196억원[국비(70%) 2,937/ 도비(15%) 494.5/ 남양주시(15%) 494.5/ 광역분담금(LH) 900억원 ○ 추진성과 : 2026년 제2차 예비타당성조사(광역철도) 대상 사업 제출 (시→도→대광위→국토부→기획예산처 / 2026. 6.)	
☒ 지속추진 ☐ 재정비 ☒ 2회 추경	○ 사업명 : 생애주기별 대중교통비 지원 ○ 총사업비 : 33,603백만원 - 기 확보액 23,760백만원, 2회 추경 9,843백만원 증액 요구 ○ 추진성과 : K패스 및 어르신, 어린이·청소년 교통비 약 19만 명 지원	
☒ 지속추진 ☐ 재정비 ☒ 2회 추경	○ 사업명 : 대광위 광역버스 준공영제 ○ 총사업비 : 12,624백만원 - 기 확보액 10,856백만원, 2회 추경 1,768백만원 증액 요구 ○ 추진성과 : 전체 광역버스 노선 전환 완료로 통한 지속적이고 안정적인 교통편의 제공	

사업유형	주요내용	참고사진
☒ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 시내버스 공공관리제 ○ 총사업비 : 23,033백만원 - 기 확보액 16,540백만원, 2회 추경 6,492백만원 증액 요구 ○ 추진성과 : 시·군간 9개 노선 121대, 시·군내 12개 노선 28대 공공관리제 전환 완료	
☒ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 공영주차장 조성사업 ○ 사업규모 : 1,003면 / 연면적 39,783m² ○ 총사업비 : 124,184백만원 - 기확보액 : 67,844백만원, 2회 추경 요구액 : 14,930백만원 ○ 추진성과 : 설계 및 공사 추진중(7개소)	
☒ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☐ 2회 추경	○ 사 업 명 : 미금로(중로1-302호) 확장공사 ○ 총사업비 : 760억원 [GH부담금 684억원(90%) / 시비 76억원(10%)] ○ 사업내용 : L=385m, B=20m(4차로 도로확장) ○ 추진성과 - 2025.07. 미금로 확장 GH 실시협약체결 - 2025.09. 주민설명회 개최 - 2026.10. 실시설계 준공 예정	
☒ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 시도5호선(중말교차로~철마교차로) 도로확장 ○ 총사업비 : 350억원(2026년 1회 추경 10억원, 2회 추경 요구액 25억원) ○ 사업내용 : L=1km, B=20m(4차로 도로확장) ○ 추진성과 - 2022.12. 주민설명회 개최 - 2024.04. 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시 - 2027.01. 보상 착수 예정	
☐ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 농어촌도로102호선(녹촌~창현) 도로확장 ○ 총사업비 : 174억원(2026년 1회 추경 20억원, 2회 추경 요구액 25억원) ○ 사업내용 : L=914m, B=20m(4차로 도로확장)	

사업유형	주요내용	참고사진
☐ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 진접 금곡리 바람골길 도로개설(소1-107호) ○ 총사업비 : 143억원(2회 추경 요구액 26억원, 편성 시 전액 확보) ○ 사업내용 : L=750m, B=10m / 1차수 L=320m, 2차수 L=430m	
☐ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 화도읍 가곡초 통학로 확장공사 ○ 총사업비 : 79억원(2회 추경 요구액 11.9억원, 편성 시 전액 확보) ○ 사업내용 : L=470m, B=10m	
☐ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 오남 양지리(대대울)진입도로 개설공사 ○ 총사업비 : 62.4억원(2026년 본예산 1억원, 2회 추경 요구액 17억원) ○ 사업내용 : L=930m, B=8m, [2구간] L=785m, [3구간] L=145m ※1구간 준공 L=331m	
☐ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 묵현20리 연결도로 개설공사 ○ 총사업비 : 84억원(2회 추경 요구액 35억원) ○ 사업내용 : L=189m, B=10m	
☐ 지속추진 ☐ 재 정 비 ☒ 2회 추경	○ 사 업 명 : 진접 금곡리 도시계획도로 개설공사 ○ 총사업비 : 103.7억원(2회 추경 요구액 36억원) ○ 사업내용 : L=710m, B=10m	

2-① 별내선(8호선) 연장(별내~별내별가람)

■ 사업개요

- 사업구간 : 별내역 ~ 별내별가람역 [사업량: 3.437km (정거장 1개소)]
- 총사업비 : 4,196억원 ※ 국비(70%) 2,307/ 도비(15%) 494.5/ 남양주시(15%) 494.5/ 광역분담금(LH) 900억원

■ 추진경과

- 2021. 7. : 제4차 국가철도망 구축계획 및 제4차 대도시권 광역교통시행계획 고시
- 2021. 11. : 예비타당성조사 대상 사업 선정 (2021년 제3차)
- 2024. 6. : 별내선 연장 예타조사 결과 알림 (경기도 → 남양주시)

결과 : 미통과 [B/C= 0.71, AHP : 0.462 (AHP가 0.5 이상일 때 사업성 확보)]

■ 추진성과

- 2026. 6. : 2026년 제2차 예비타당성조사 대상 사업 제출(시→도→대광위→국토부→기획예산처)
 - 2025. 5. : 별내선 연장 재기획 연구용역 추진
 - 2026. 6. : 국토부 투자심사위원회 통과
 - 2026. 6. ~ 7. : 국토부 제1차관 및 기획예산처 장관 정책 건의

■ 향후계획

- 2026. 8. : 제2차 예비타당성조사 대상 사업 선정(기획예산처)

2-② 생애주기별 대중교통비 지원

■ 사업개요

- 사업목적 : 시민의 대중교통 이용 활성화와 교통비 부담 완화를 위해 일반 시민부터 어르신, 어린이·청소년까지 생애주기별 맞춤형 교통비 지원

	K패스	어르신 교통비 지원	어린이·청소년 교통비 지원
지원대상	K패스 가입 이용자	남양주시 거주 만 65세 이상 어르신	경기도 내 거주 만 6~18세 어린이·청소년
지원내용	월 15회 이상 이용 시 교통비 정률 또는 정액 지원	연 12만원 한도 지원 (분기별 3만원 내)	연 24만원 한도 지원 (분기별 6만원 내)
지원범위	버스·지하철 등 대중교통 (고속시외버스, KTX 등 열차 제외) ※ 2026. 4. ~ 9. 고유가 대응 K패스 확대 지원	관내 마을· 시내버스 또는 관외 남양주시 경유 시내버스	수도권 지하철 및 버스
소요예산 (2회 추경 요구)	25,924백만원 *시비 9,073백만원 (국 50%, 도 15%, 시 35%)	6,420백만원 (시 100%)	1,259백만원 *시비 (도 50%, 시 50%)

■ 추진현황

- K패스 : 2026년 보조금 1·2차 총 11,659백만원 지급(이용자 103,216명)
- 어르신 교통비 : 2026년 1분기 1,405백만원 지급(이용자 66,767명)
- 어린이·청소년 교통비 : 2026년 1차분 804백만원 지급(이용자 약 23,000명)

■ 향후계획

- 2026. 7. ~ 12. : 교통비 지원 및 이용현황 지속 관리

2-③ 대광위 광역버스 준공영제

■ 사업개요

- 대광위 광역버스 준공영제 운영 지원을 통한 안정적인 광역버스 이용 환경을 시민들에게 제공
 - ※ 우리 시 관할 광역버스 전체 노선(28개 노선 229대) 및 경유 노선(4개 노선 16대)
- 총사업비 : 12,624백만원(2회 추경 1,768백만원 증액 요구)

■ 추진경과

- 2020년 대광위 광역버스 준공영제 최초 전환(M2341 광역급행버스)으로 시작하여 2024년 12월 전체 노선 전환 완료(경기도 공공버스 → 대광위 광역버스 준공영제)

■ 추진성과

- 경기도 공공버스(도 30%, 시 70%) 대비 국비 지원 확보(국 50%, 도 15%, 시 35%)로 시비 부담 절감
- 준공영제 재정지원과 서비스 향상을 통한 안정적인 광역버스 운행으로 시민 출퇴근, 통학 등 광역 교통 이용편의 증진 📈 일평균 약 4만 명 이용

■ 향후계획

- 대광위 광역버스 준공영제 노선 확충 및 안정적 운영 추진

2-④ 시내버스 공공관리제

■ 사업개요

- 시내버스 운영의 공공성 강화와 교통편의 증진을 위하여 경기도 시내버스 준공영제 시행
- 총사업비 : 23,033백만원 (제2회 추경 요구액 반영)
 - (시·군간) 15,427백만원 (제2회 추경 6,492백만원 증액 요구 / 시비 100%)
 - (시·군내) 7,606백만원 (도비 30%, 시비 70%)
- 사업량 : (시·군간) 23개 노선 264대, (시·군내) 36개 노선 123대

■ 추진경과

- 2023. 6. : 자치단체 설명회 및 토론회
- 2023. 7. ~ 10. : 재정협약 및 사업자 선정(경기도)
- 2024. 1. ~ 2027. 12. : 시내버스 공공관리제 사업 시행

■ 추진성과

- 시·군간 9개 노선 121대 전환완료 (전환율 : 45.8%)
- 시·군내 12개 노선 28대 전환완료 (전환율 : 22.8%)

■ 추진 시 문제점 및 대책

- 공공관리제 시내버스 노선의 경우 예산 증액이 수반되는 사업계획 변경* 시 경기도 협의 및 승인 필요

* 전환기준 초과 증차 및 증회, 경로연장, 계통분리 등

☞ 교통수요 변화에 대응할 수 있도록 예비 재원을 확보하고 노선 간 이용수요 데이터

분석을 통해 전환 기준 범위 내에서 증·감차 조정

- 서울특별시가 내부 교통 혼잡으로 인한 시계외 버스의 서울 도심 진입을 엄격하게 관리함에 따라 불암산역, 태릉입구역 등 서울 경계지역 연계 노선의 신설 및 증차 시 기존 노선의 감차가 요구되어 지역 간 이해관계 충돌 발생

☞ 서울특별시 경계지역 노선 신설 및 증차에 대해 사전 협의체계를 구축하여 한시적

또는 조건부 예외 적용을 건의하고, 관내 통합환승센터 연계를 통해 출퇴근 시간대 서울 도심 진입 노선에 대한 수요 분산

■ 향후계획

- 2026. 10. : 시·군간 7개 노선 66대 전환 예정
- 2026. 11. : 시·군내 8개 노선 9대 전환 예정
- 2027. : 시·군간 7개 노선 77대 전환 예정, 시·군내 16개 노선 86대 전환 예정

2-⑤ 공영주차장 조성사업

공영주차장 조성 추진현황

(단위 : 백만원)

연 번	사 업 명	사업비		주차면수	연면적(m ²)	추진현황	향후계획
	총 계	124,184		1,003	39,783		
1	퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립	계	21,000	174	6,301	공사중 (공정률 65%)	2026. 12. : 주차장 운영 개시 2027. 04. : 공사 준공
		자체	19,000				
		외부	2,000				
2	다산진건지구(주9) 공영주차장 건립	계	11,549	94	2,932	공사중 (공정률 60%)	2026. 10. : 주차장 운영 개시 2026. 12. : 공사 준공
		자체	8,549				
		외부	3,000				
3	다산역 환승주차장 건립	계	43,900	308	16,206	공사중 (공정률 27%)	2027. 03. : 공사 준공
		자체	3,412				
		외부	40,488				
4	와부읍 팔당2리 공영주차장 조성	계	2,995	26	2,154	실시설계중 (공정률 30%)	2026. 10. : 실시설계 완료 2026. 11. : 공사 착공 2026. 12. : 공사 준공
		자체	2,995				
		외부	-				
5	평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립	계	10,900	68	2,893	실시설계중 (공정률 83%)	2026. 10. : 공사 착공 2028. 04. : 공사 준공
		자체	7,500				
		외부	3,400				
6	다산지금지구(주2) 공영주차장 건립	계	33,800	318	8,526	실시설계중 (공정률 82%)	2026. 12. : 공사 착공 2028. 10. : 공사 준공
		자체	31,300				
		외부	2,500				
7	와부 빗터널 임시 공영주차장 조성	계	40	15	771	사전행정절차 이행중	2026. 09. : 공사 착공 및 준공
		자체	40				
		외부	-				

공영주차장 조성 사진대지



1. 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립(현장사진)



2. 다산진건지구(주9) 공영주차장 건립(현장사진)



3. 다산역 환승주차장 건립(현장사진)



4. 와부읍 팔당2리 공영주차장 조성(위치도)



5. 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립(조감도)



6. 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립(조감도)



7. 와부 빗터널 임시 공영주차장 조성(현장사진)

2-⑥ 미금로(중로1-302호) 확장공사

■ 사업개요

- 위 치 : 다산동 4302-48번지 일원
- 사 업 량 : L=385m, B=20m(4차선 확장)
- 공사기간 : 2027. 6. ~ 2029. 12.
- 총사업비 : 760억원 (설계비 10억원 / 보상비 612억원 / 공사비 138억원) ※ 기확보액 11.5억

■ 추진경과

- 2025. 5. : 실시설계용역 착수(공정률 90%, 2026. 10. 준공 예정)
- 2025. 7. : GH 재원분담 협약 체결 [GH 684억(90%), 남양주시 76억(10%)]
- 2026. 6. : 도시관리계획 변경 및 실시계획인가 신청

■ 추진성과

- 미금로(중로1-302호선) 확장에 따라 다산1동, 다산2동 인구 14만명 교통편익 증진

■ 향후계획

- 2026. 11. : 보상절차 추진 ※ 건축물 18개동, 사유지 31필지
- 2027. 6. ~ 2029. 12. : 공사 추진

■ 위치도



2-⑦ 시도5호선(중말교차로~철마교차로) 도로확장

■ 사업개요

- 위 치 : 진접읍 진벌리 521-1 ~ 팔야리 757-5번지 일원
- 사업량 : L=1.0km, B=20m(4차로 도로확장)
- 공사기간 : 2027. 9. ~ 2029. 9.
- 총사업비 : 350억원 (설계비 6억원 / 보상비 200억원 / 공사비 144억원)
※ 기획보액 16억원, 2회 추경 요구액 25억원(보상비)

■ 추진경과

- 2022. 4. 25. : 실시설계용역 착수(공정률 95%)
- 2024. 4. 30. : 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2026. 5. 12. : 경관심의(조건부 의결)

■ 추진성과

- 시도5호선(중말교차로~철마교차로) 확장에 따라 진접읍 인구 3만 9천명 교통편익 증진
※ 진접읍 현장 시장실 건의사항(진벌리 기업인회, 팔야 기업인회 중점 건의 구간)

■ 향후계획

- 2026. 11. : 보상계획 공고 ※ 200필지 보상 예정
- 2027. 9. ~ 2029. 9. : 공사 추진

■ 위치도



3-① 농어촌도로102호선(녹촌~창현) 도로확장

■ 사업개요

- 위 치 : 화도읍 녹촌리 303-13 ~ 창현리 577-7(녹촌교)
- 사업량 : L=914m, B=20m (4차로 도로확장)
- 공사기간 : 2027. 9. ~ 2029. 9. (설계 공정율 : 95%)
- 총사업비 : 174억원 (설계비 4억원 / 보상비 100억원 / 공사비 70억원)

■ 사업 필요성

- 2026년 10월 국도46호선 녹촌IC 개통 예정에 맞춰 농어촌도로102호선(녹촌~창현)을 2차선에서 4차선으로 확장하여 주민불편 및 교통정체를 해소하고자 함(수혜인원 : 28,000명 이상)

■ 투자계획

- 총사업비 : 174억원(기확보액 24억원, 2026년 2회 추경 요구액 25억원)


(단위:억원)

재원별	계	2026년 1회추경까지	2026년 2회추경	2027년 이후	비고
계	174	24	25	125	
시비	174	24	25	125	

■ 향후계획

- 2026. 11. : 농어촌도로 노선지정(변경) 고시
- 2026. 12. : 보상계획 공고 ※ 189필지 보상 예정
- 2027. 9. ~ 2029. 9. : 공사 추진

위치도

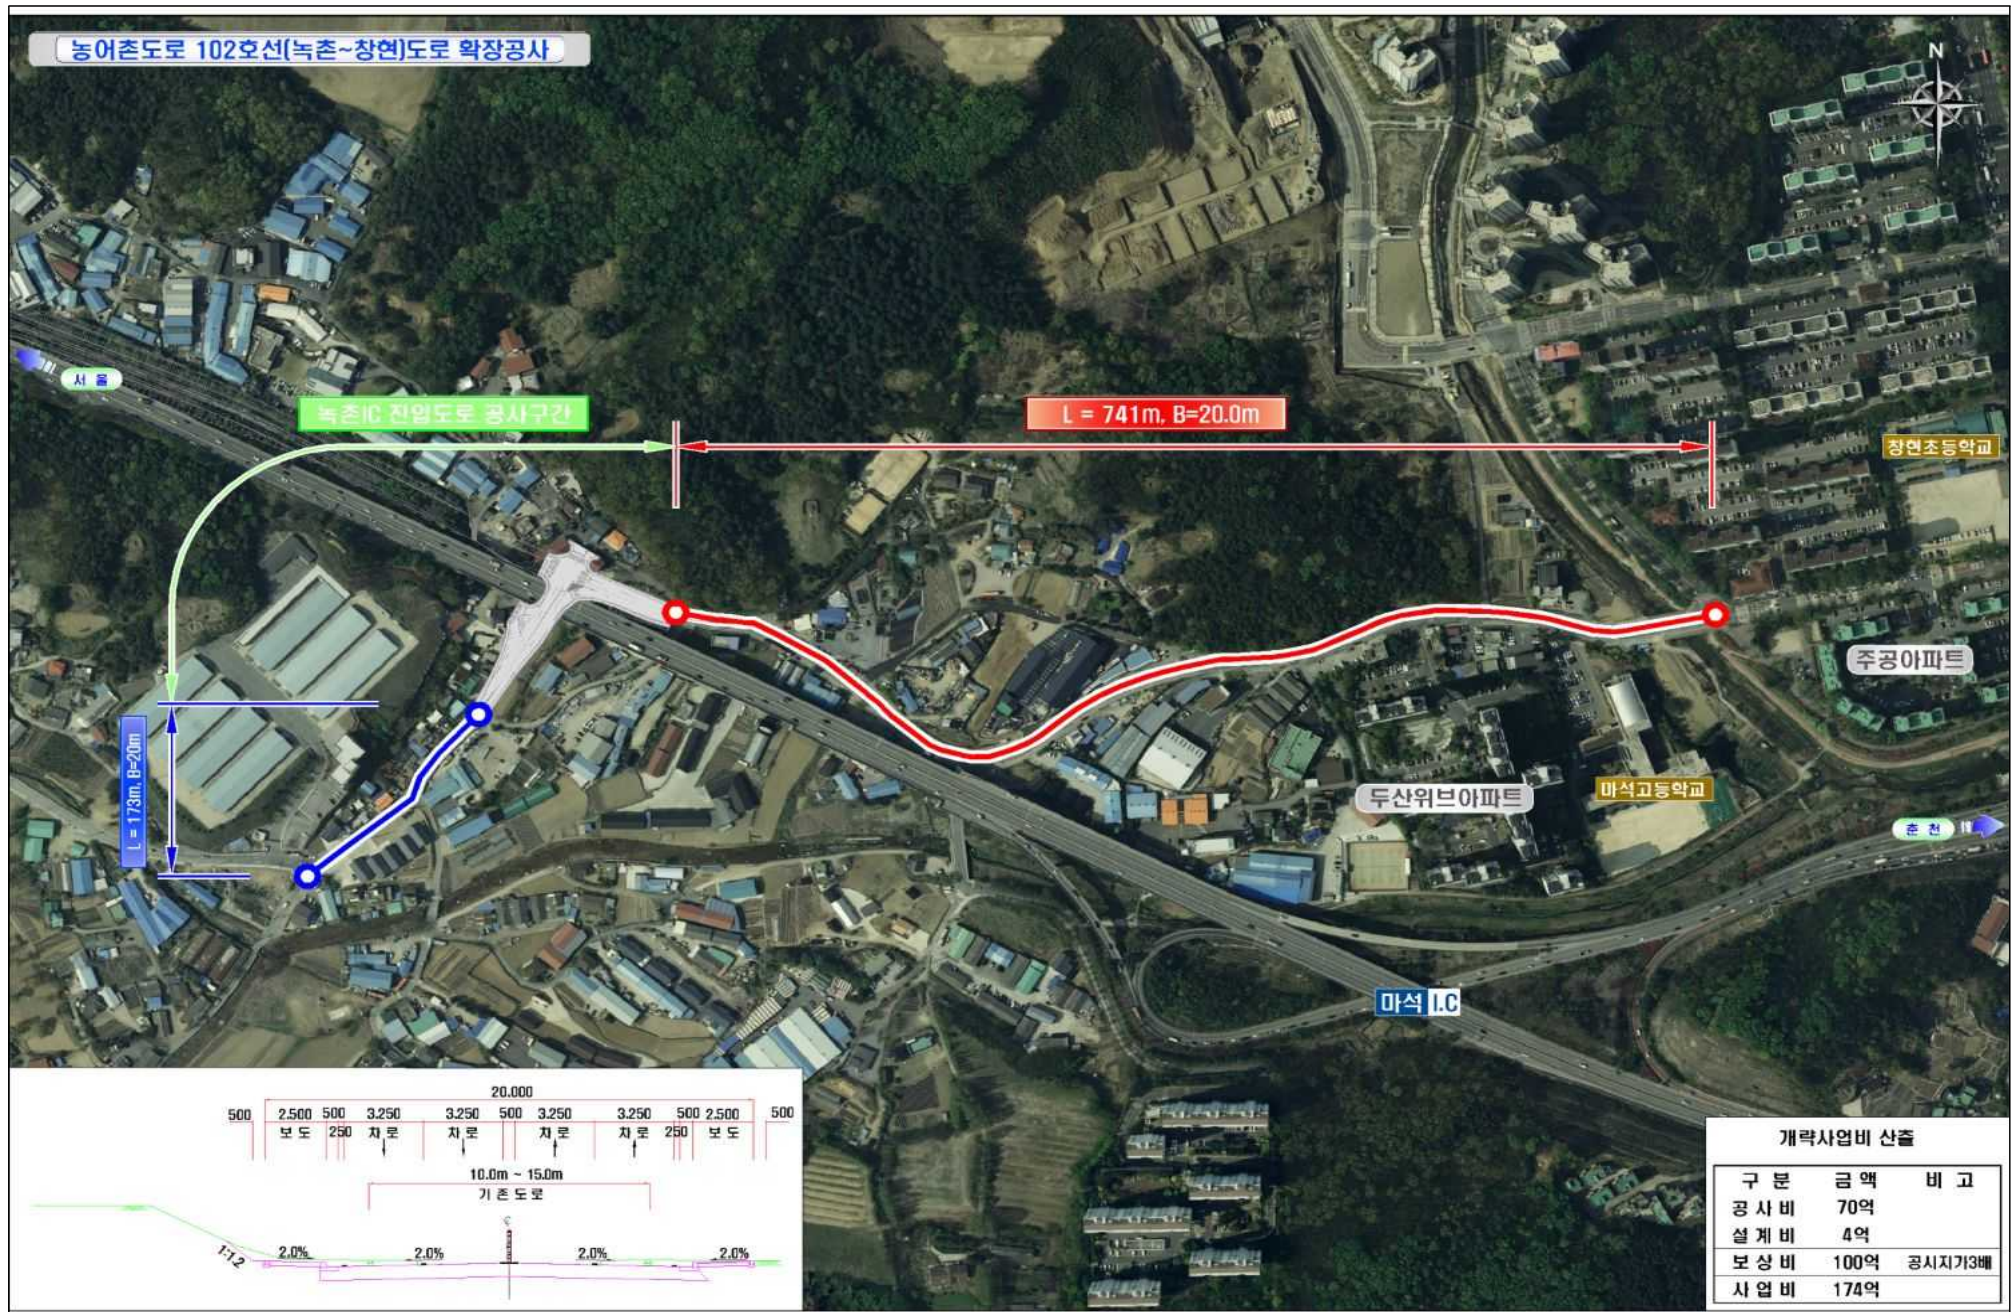

3-② 진접 금곡리 바람골길 도로개설(소1-107호)

■ 사업개요

- 위 치 : 진접 금곡리 115-2번지 ~ 성관사 앞
- 기 간 : 2020. 3. ~ 2027. 12.
- 내 용 : L=750m, B=10m 1차수 L=320m, 2차수 L=430m
- 총사업비 : 143억원(설계비 3억원 / 보상비 105억원 / 공사비 35억원)

■ 사업 필요성

- 현황도로의 차량교통에 어려움이 있어 대형차량 진입 및 지역주민(바람골 기업인회 등)의 통행불편 민원을 해소하고자 함(수혜인원 : 37,321명 이상)

■ 투자계획

- 총사업비 : 143억원(2회 추경 요구액 26억원, 편성 시 전액확보)

(단위:억원)

재 원 별	계	2026년 1회추경까지	2026년 2회추경	2027년 이후	비 고
계	143	117	26	—	
시 비	135	109	26	—	
외부재원	8	8		—	특교세(5), 특조금(3)

■ 향후계획

- 2027. 5. : 준공(전체구간)

■ 위치도



3-③ 화도읍 가곡초 통학로 확장공사

■ 사업개요

- 위 치 : 화도읍 가곡리 279-15번지 ~ 284-127번지 일원
- 기 간 : 2021. 10. ~ 2027. 12.
- 내 용 : L=470m, B=10m
- 총사업비 : 79억원(설계비 2억원 / 보상비 65억원 / 공사비 12억원)

■ 사업 필요성

- 가곡초 정문 앞 차량·보행자 혼재로 인한 교통안전 민원이 지속적으로 제기되어, 안전한 통학로를 조성하고자 함 [수혜인원 : 6,257명 이상(가곡초 학생 포함)]

■ 투자계획

- 총사업비 : 79억원(2회 추경 요구액 11.9억원, 편성 시 전액확보 / 보상률 63%)

(단위:억원)

재 원 별	계	2026년 1회추경까지	2026년 2회추경	2027년 이후	비 고
계	79	67.1	11.9	—	
시 비	73	61.1	11.9	—	
외부재원	6	6	—	—	특교세

■ 향후계획

- 2026.12. 잔여지 보상 완료 ※ 미보상 22필지(전체 60필지)
- 2027. 3. ~ 12. : 착공 및 준공

■ 위치도



3-④ 오남 양지리(대대울)진입도로 개설공사

■ 사업개요

- 위 치 : 오남읍 양지리 777-18번지 ~ 794-5번지 일원(대대울)
- 기 간 : 2018. 10. ~ 2028. 12.
- 내 용 : L=930m, B=8m [2구간] L=785m, [3구간] L=145m / ※ 1구간 준공 L=331m
- 총사업비 : 62.4억원(설계비 2.5억원 / 보상비 37.9억원 / 공사비 22억원)

■ 사업 필요성

- 오남읍 양지리 일원 공장밀집지역 진입도로 확장을 통해 대형차량 진입 및 지역주민(대대울 기업인회 등)의 통행불편 민원을 해소 (수혜인원 : 16,226명 이상)

■ 투자계획

- 총사업비 : 62.4억원 (기확보액 26.4억원, 2회 추경 요구액 17억원 / 2구간 보상률 53%)

(단위:억원)

재 원 별	계	2026년 1회추경까지	2026년 2회추경	2027년 이후	비 고
시 비	62.4	26.4	17	19	

■ 향후계획

- 2026. 7. : 실시설계용역 착수(3구간)
- 2026. 12. : 도시관리계획 결정(3구간)
- 2027. 3. : 실시계획인가 고시(3구간)
- 2027. 4. ~ 2028. 2. : 보상협의(2,3구간)
※ 2구간 미보상 2필지(전체 44필지), 3구간 10필지 보상 예정
- 2028. 3. ~ 12. : 착공 및 준공(2,3구간)

■ 위치도



3-⑤ 목현20리 연결도로 개설공사

■ 사업개요

- 위 치 : 화도읍 목현리 40-1번지 ~ 36-16번지 일원(마석역신도브래뉴, 삼익A 진입구간)
- 기 간 : 2023. 7. ~ 2027. 12.
- 내 용 : L=189m, B=10m
- 총사업비 : 84억원(설계비 2억원 / 보상비 70억원 / 공사비 12억원)

■ 사업 필요성

- 목현20리 일원의 도로가 지방도 387호선과 단절되어 지속적인 주민 건의가 요구된 사항으로, 통행 불편 민원을 해소하고자 추진하는 사업임(수혜인원 : 34,189명 이상)

■ 투자계획

- 총사업비 : 84억원 (기확보액 2억, 2회 추경 요구액 35억원 / 보상률 0%)

(단위:억원)

재 원 별	계	2026년 1회추경까지	2026년 2회추경	2027년 이후	비 고
계	84	2	35	47	
시 비	84	2	35	47	

■ 향후계획

- 2026. 9. : 실시계획인가 변경 고시 ○ 2027. 6. : 착공
- 2026. 10. : 보상 협의 ※ 9필지 보상 예정

■ 위치도



3-⑥ 진접 금곡리 도시계획도로 개설공사

■ 사업개요

- 위 치 : 진접읍 금곡리 841-3번지 ~ 227-3번지 일원(금곡천 옆)
- 기 간 : 2018. 5. ~ 2028. 6.
- 내 용 : L=710m, B=10m
- 총사업비 : 103.7억원(설계비 2.4억원 / 보상비 72억원 / 공사비 29.3억원)

■ 사업 필요성

- 진접선 차량기지 이전공사(발주처 서울시 도시기반시설본부)에 대한 다수인민원 보상차원으로 시작된 사업으로, 금곡리 마을안길의 협소한 도로를 개선하여 통행불편 민원을 해소하고자 추진하는 사업임
(수혜인원 : 37,321명 이상)

■ 투자계획

- 총사업비 : 103.7억원 (기확보액 3억원, 2회 추경 요구액 36억원 / 보상률 0%)

(단위:억원)

재 원 별	계	2026년 1회추경까지	2026년 2회추경	2027년 이후	비 고
시 비	103.7	3	36	64.7	

■ 향후계획

- 2026. 10. ~ 2028. 2. : 보상협의 ※ 89필지 보상 예정
- 2028. 3. ~ 2028. 12. : 착공 및 준공

■ 위치도

